

TAIPEI 國立臺北科技大學
TECH National Taipei University of Technology

誠, 樸, 精, 勤



校園建設工程報告

報告人：段總務長葉芳



TAIPEI 國立臺北科技大學
TECH National Taipei University of Technology

2





校園建設：榕園璞樓

四棵樹柱代表著校友的呵護，並滋養在樹屋裡活動的學弟妹。



鐘聲提醒學習作息，並於適當時機鳴奏校歌。

世界唯一的樹屋鐘樓讓學弟妹處於視覺、聽覺、觸覺的整體氛圍中，滋養他們的心靈，並轉化成為對校友成就的憧憬，使學生能懷抱未來建立人生努力的目標。




鐘樓面積計算圖

- 本案樹屋(室內空間)僅187m²，包含戶外平台合計730m²，非屬大面積開發。
- 室內空間僅作為教學及學術研究討論用途。

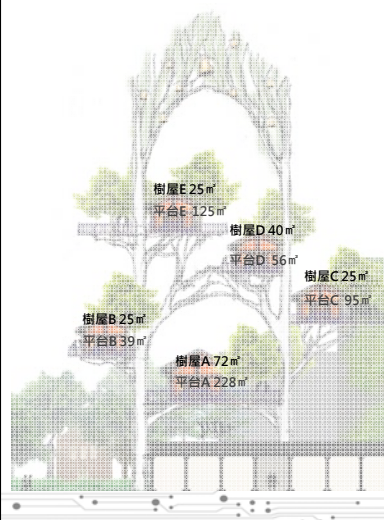

類別	項次	面積	類別合計面積	樹屋平台合計面積	榕園璞樓總投影建築面積
樹屋	樹屋A	72m ²	187m ²	730m ²	494.30m ²
	樹屋B	25m ²			
	樹屋C	25m ²			
	樹屋D	40m ²			
	樹屋E	25m ²			
平台	平台A	228m ²	543m ²	730m ²	494.30m ²
	平台B	39m ²			
	平台C	95m ²			
	平台D	56m ²			
	平台E	125m ²			

校園建設：榕園

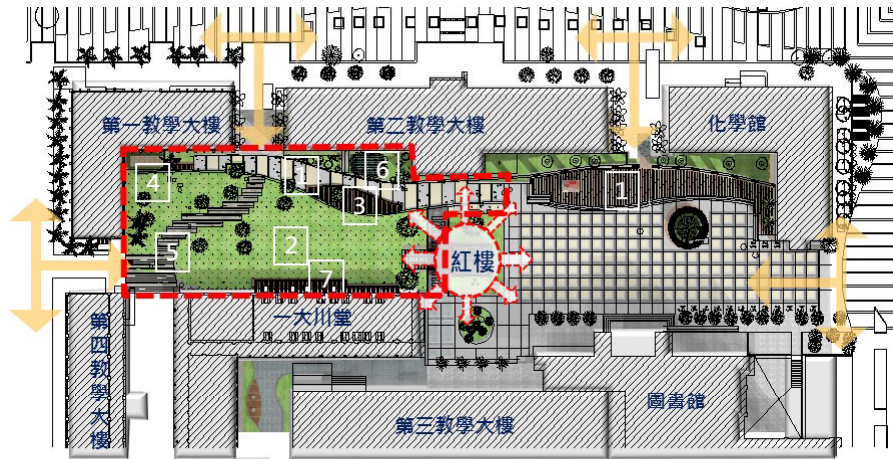

- 1. 弧型牆延伸弧形步道
 - 2. 榕園草地空間
 - 3. 休憩木平台及座椅
 - 4. 端景塑造區
 - 5. 石板步道
 - 6. 生態水池區
 - 7. 綠草碼頭木平台
- - 施作範圍
▲ 全區配置圖

校園建設：榕園



校園建設：中正館內裝整修

目前進度：
基本設計已完成，細部設計進行中

- 預計開工日為105.11.2
- 總樓地板面積：約
1,957.24m² (593坪)
- 預計建設經費：約4,858萬元
- 預計完工日為106.6.1



校園建設：中正館內裝整修



校園建設：精勤樓新建工程

目前進度：

105.5.16已辦理開工典禮，鄰房
鑑定施測中

- 地下4層，地上14層
- 總樓地板面積：約18,054m²
(5,461.55坪)
- 預計建設經費：約7.4億元
- 預計履約期限1,100日曆天



13

校園建設：車輛醫院新建工程

目前進度：

已完成簽約，目前建照重新申
辦中，管線設施遷移施工中

- 地下1層，地上5層
- 總樓地板面積：約
1,957.24m² (593坪)
- 預計建設經費：約6,532萬元
- 預計履約期限450日曆天



14

校園建設：群光大樓及校友體育館新建工程

目前進度：

已完成建築師招標，已開始進行基本設計

- 群光大樓：地下2層，地上15層；
- 校友體育館：地下2層，地上5層

- 總樓地板面積：約32,304 m²
(9,772坪)

- 預計建設經費：約17.34億元

- 預定107年興建，109年完工









校園建設：誠樸樓新建工程

目前進度：
辦理建造執照、綠建築、智慧
建築、細部設計之審查

- 地下3層，地上11層
- 總樓地板面積：約4,530m²
(1,370.32坪)
- 預計建設經費：約2.826億
元
- 預計105年工程發包，108
年完工

